



# 广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑 门关土鸡标准化养殖基地建设项目 (三期) 支出绩效评价报告

**项目名称：**广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标  
准化养殖基地建设项目（三期）支出绩效评价

**项目单位：**广元市昭化区农业农村局

**主管部门：**广元市昭化区农业农村局

**委托单位：**广元市财政局

**评价机构：**北京博思恒效咨询有限公司

2021 年 12 月

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作情况.....	5
(一) 绩效评价目的和评价依据.....	5
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	6
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	6
(四) 绩效评价实施过程.....	6
三、评价结论和绩效分析.....	7
(一) 评价结论.....	7
(二) 具体绩效分析.....	8
四、项目存在的问题和建议.....	23
(一) 存在的问题.....	23
(二) 建议和改进措施.....	24
五、附件.....	26

# 广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关 土鸡标准化养殖基地建设项目 （三期）支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《广元市昭化区人民政府办公室关于印发广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则的通知》（昭府办函〔2018〕118号）和《广元市昭化区财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（昭财预〔2021〕1号）的要求，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效公司”）接受广元市昭化区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，于 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 30 日对广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（以下简称“本项目”）东西部扶贫协作资金开展财政重点评价。现将重点评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景及目的

自东西部扶贫协作工作开展以来，广元市昭化区为推动东西部扶贫协作持续发力，进一步巩固提升脱贫成果，确保高质量完成脱贫攻坚目标任务。大力推进剑门关土鸡产业标准化、规模化

养殖，打造土鸡全产业链，促进农民增收致富，推动农业提质增效。

为切实贯彻市委政府 2020 年农业生产意见，按照《广元市昭化区浙广扶贫协作领导小组关于印发广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目实施计划的通知》（昭浙广扶贫〔2020〕2 号）要求，在昭化剑门关建立土鸡养殖示范基地，由村集体带领农户发展土鸡养殖，使村集体和农户共同发展，实现农村“双层经营”的模式。

## 2.项目实施情况

广元市昭化区农业农村局（以下简称“区农业农村局”）按照《广元市昭化区浙广扶贫协作领导小组关于印发广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目实施计划的通知》（昭浙广扶贫〔2020〕2 号），根据东西部扶贫协作“三年行动方案”于 2020 年 2 月编报 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡育雏中心建设项目（三期）实施方案，经区东西部扶贫协作领导小组办公室审定后上报区脱贫攻坚指挥部（领导小组）审批立项。根据《广元市昭化区脱贫攻坚指挥部（领导小组）关于印发广元市昭化区 21 个扶贫专项 2020 年实施方案的通知》（昭脱贫指发〔2020〕1 号），各镇报送项目子方案，经区农业农村局审批后项目正式实施。

2020 年 3 月 23 日，区农业农村局党组书记、局长王振江主持召开局党组第四次会议，专题研究了 2020 年东西部协作项目推进工作。

项目在卫子镇、王家镇规范建设剑门关土鸡标准化育雏中心 13 个（其中彩钢棚结构 11 个，塑料大棚结构 2 个），截至绩效评价之日，已全部完成。共新建标准化育雏舍 15600 平方米。每个育雏中心长 100 米、宽 12 米，面积 1200 平方米，配套自动饮水、自动投料、自动温控等设备各 1 套，完善水、电、路、排水渠系、粪污处理等基础设施。

### 3. 资金安排及使用情况

按照区委办印发的《龙泉·昭化东西部扶贫协作三年（2018-2020 年）实施方案》（昭委办〔2018〕107 号）文件要求，根据《区浙广扶贫协作领导小组印发的广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目实施计划的通知》（昭浙广扶贫〔2020〕4 号）和《广元市昭化区脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室关于印发广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目资金计划的预通知》（昭脱贫指办〔2020〕1 号）文件内容，昭化区 2020 年东西部协作项目资金土鸡标准化养殖基地项目 380 万，实际到位 380 万元，占下达计划的 100%。截至 2021 年 8 月 31 日实际支付资金 380 万元（详见下表）。

项目支出内容	资金支出情况（单位：万元）
王家镇安平村李彦林土鸡发展补助	20
刘元文土鸡发展补助	20
邓怀富土鸡发展补助	20
白果狮子村胡静土鸡发展补助	55
四海三联土鸡发展补助	210
王家镇安平村李奎林土鸡发展补助	30
广元市昭化区成邦建材经营部工程款（王家镇道角村）	25
<b>合计</b>	<b>380</b>

## 4.组织及管理情况

### （1）项目组织情况

本项目由区农业农村局主管负责项目申报立项，技术指导，监督监管，资金拨付和管理，并组织项目检查验收和绩效评价等工作。项目镇根据实际建设内容，编制项目子方案报送区农业农村局审核批复后按方案组织实施，项目镇、村成立东西部协作项目工作小组，负责项目实施方式、质量监督、施工队伍确定等相关工作，指导项目村及时收集完善项目建设资料，做好项目验收并按进度组织报账。本项目采取“民办公助，先建后补，以奖代补”方式组织实施，并实行区级报账制，所有项目资金直接支付到补助对象账户或项目施工方。

### （2）项目实施流程

根据“项目三年行动方案”项目均由各镇自行申报，区农业农村局审核汇总后编报年度项目实施方案，经区东西部扶贫协作领导小组办公室审定后上报区脱贫攻坚指挥部（领导小组）审批立项，根据《广元市昭化区脱贫攻坚指挥部（领导小组）关于印发广元市昭化区 21 个扶贫专项 2020 年实施方案的通知》（昭脱贫指发〔2020〕1 号）各镇自行组织实施。

### （3）资金拨付流程

本项目实行区级报账制，严格按照《广元市昭化区东西部扶贫协作项目管理暂行实施细则》（昭府办函〔2018〕122 号）及《广元市昭化区东西部扶贫协作援助资金管理办法（修订）》（昭

府办函〔2019〕20号）进行管理，由各项目村根据项目实施进度情况，向区农业农村局提交相关资料，由区农业农村局根据各项目村项目施工合同，按照工程进度、完工情况、验收情况等提出申请，报区协作办、区项目分管县级领导、区援建方领导和分管财政县级领导审批后直接支付。

## （二）项目绩效目标

项目具体绩效目标指标见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	新建育雏中心	13 个
			建标准化育雏舍	15600 平方米
			配套自动设备	1 套
		质量指标	质量标准	合格
		时效指标	完工时间	2020/11/30 前
		成本指标	每个育雏中心建设成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	年新增脱温鸡苗	100 万羽
		社会效益指标	带动就业人数	120 人
		可持续影响指标	剑门土鸡产业发展	稳步推进
	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的和评价依据

本次绩效评价全面梳理昭化区剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目背景、组织管理、实际投资建设、财政支持等情况，核查项目管理过程是否规范，资金使用是否合规、合理、合法，项目产出目标是否完成，资金投入与项目产出的匹配度，以及效果目标是否实现等方面的内容。

本次评价依据包括《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《广元市昭化区财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（昭财预〔2021〕1 号）等政策法规及文件。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

本项目绩效评价指标体系及工作方案的设计依据国家及广元市相关绩效评价政策制度，结合委托方要求和项目单位实际情况，综合资料梳理及实地调研情况，深入分析项目特点、年度预算、项目效益效果情况，经项目组讨论、区财政局认同等环节最终确定绩效评价指标体系及工作方案。评价指标体系详见“附件一：广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）支出绩效评价指标体系暨评分表”。

## （三）绩效评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵守科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则。

### 2.绩效评价方法

绩效评价方法综合采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

## （四）绩效评价实施过程

### 1.数据填报和采集

根据绩效评价工作安排，成立绩效评价工作组，开展前期调研，收集与绩效评价相关的文件资料，调研过程中研究制定绩效

评价指标体系，并根据绩效评价需求补充收集相关资料。绩效评价工作组围绕绩效评价指标，采取勘查、询问、资料审阅、访谈、调查问卷等方式，收集绩效评价基础数据，并对有关情况进行核实，制定实施方案。

## 2. 社会调查

为梳理分析剑门关土鸡标准化养殖基地东西部扶贫协作资金项目 2020 年度的实施效果，工作组制定调查问卷，考察昭化区乡镇政府工作人员、剑门关土鸡养殖户及农户对政策的满意程度，通过发放、收集和统计调查问卷，了解受益群体的满意度。

## 3. 数据分析和撰写报告

绩效评价工作对照确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对项目的决策情况、管理情况、绩效完成情况进行绩效评分，根据评价情况撰写绩效评价报告，经公司内部审核及征求相关方意见建议修改完善后形成正式的绩效评价报告。最后按照要求及时提交绩效评价报告、绩效评价指标得分表及相关佐证材料。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

### 1. 评价结果

按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函〔2018〕118号）的规定，绩效评价量化分值采取百分制，评价结果分为优（得

分 $\geq 90$ )、良(90 $>$ 得分 $\geq 80$ )、中(80 $>$ 得分 $\geq 70$ )、差(得分 $< 70$ )四个等级。2020 年度“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地项目（三期）东西部扶贫协作资金财政重点绩效评价评分为 89.70 分，评价结果为“良”，绩效评价评分汇总表见下表：

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 目标完成	D 项目效果	合计
权重	20 分	25 分	15 分	40 分	100 分
得分	16.00 分	22.60 分	13.00 分	38.10 分	89.70 分
得分率	80.00%	90.40%	86.67%	95.25%	89.70%

## 2. 主要绩效

项目严格按照实施方案组织实施，新建成全彩钢结构标准化剑门关土鸡育雏中心 13 个，其中王家镇平安村 3 个、道角村 1 个，卫子镇新场村 7 个、狮子村 2 个，新建育雏舍总面积 16200 平方米，每栋育雏舍配套了自动饮水、自动投料、自动温控等设备各 1 套。各育雏中心管理、水电路、污粪处理等基础设施配套齐全。

标准化土鸡养殖场的建设，有效带动了广元市昭化区卫子镇、王家镇产业发展、增加当地增收额、扩大当地人员招聘等经济贡献、可持续发展均有一定作用。

### （二）具体绩效分析

#### 1. 项目决策分析

A 类项目决策指标，包括绩效目标、决策依据和资金投入 3 个二级指标，由 6 个三级指标构成。标准分值 20 分，实际得分 16 分，得分率 80%。各分项指标的评价分析和绩效得分具体如

下：

指标名称	指标权重	实际得分
<b>A1 绩效目标</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
A11 绩效目标合理性（3 分）	3.00	3.00
A12 绩效指标明确性（3 分）	3.00	3.00
<b>A2 决策依据</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>
A21.立项依据充分性（3 分）	3.00	3.00
A22.立项程序的规范性（4 分）	4.00	2.00
<b>A3 资金投入</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>
A31 资金分配过程的合规性、合理性、及时性（3 分）	3.00	3.00
A32 预算编制科学性（4 分）	4.00	2.00
<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>16.00</b>

### A1.绩效目标

该部分主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。

#### A11.绩效目标合理性

该项考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。经查阅东西部扶贫协作“三年行动方案”、绩效目标申报表、2019 年工作总结及 2020 年工作计划等资料，2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目绩效目标设定依据充分，各项需求指标明细，论证合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### A12.绩效指标明确性

经查阅广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目实施计

划、广元市昭化区农业农村局 2020 年项目实施方案、绩效目标申报表等文件资料及自评报告,经综合判断项目目标明确、合理,未发现异常。

该指标满分 3 分,根据评分标准得 3 分。

## A2.决策依据

该部分主要考察昭化区“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设（三期）项目立项情况,考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,以及项目申请、设立过程是否符合相关要求。

### A21.立项依据充分性

该项考核项目立项是否符合法律法规、相关政策。

根据东西部扶贫协作“三年行动方案”、《广元市昭化区 21 个扶贫专项 2020 年实施方案》、《广元市昭化区 2020 年东西部扶贫协作项目实施计划的通知》（昭浙广扶贫〔2020〕2 号），结合土鸡养殖场实地踏勘的资料,该项目的实施符合相关的政策及部门职责,项目立项依据充分。

该指标满分 3 分,根据评分标准得 3 分。

### A22.立项程序的规范性

通过询问本项目管理专员证实,此项目属于东西部扶贫协作三年行动计划延续性项目,未针对 2020 年项目编制项目可行性研究报告。无立项申请及批复文件。依据项目实施方案的请示文件及批复,综合判断该项目符合发展规划。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

### A3.资金投入

该部分主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考察预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

#### A31.资金分配过程的合规性、合理性、及时性

根据区农业农村局提供的广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）实施方案、项目申报表、年度工作目标、《卫子镇党政办公室扶贫项目实施专题会议纪要》（第 4 期），项目预算总投资 814 万元。其中，东西部扶贫协作资金 380 万元（其中：王家镇安平村育雏中心建设项目 90 万元，王家镇道角村育雏中心建设项目 25 万元，卫子镇新场村育雏中心建设项目 210 万元，卫子镇狮子村育雏中心建设项目 55 万元。），群众自筹 434 万元。资金分配基本合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### A32.预算编制科学性

该指标考察的内容有：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

截止 2021 年 8 月 31 日，区农业农村局仅提供了广元昭化区财政局预下达追加(减)预算通知单及项目建设任务和投资概算，项目“工程直接费”未提交区财政局评审中心进行评审，也未见第三方机构对投资概算编制的合理性及科学性进行评审，本项目的预算编制科学性存疑。另外未对项目的具体成本进行明细测算，如建设育雏中心未对平地费、地面硬化、辅料费等成本进行细分并作充分比价，预算额度的测算依据相对薄弱。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

## 2.项目管理

B 类项目管理类指标，包括资金到位、资金管理、财务管理和组织实施 4 个二级指标，由 9 个三级指标构成。标准分值 25 分，实际得分 22.6 分，得分率 90.4%。各分项指标的评价分析和绩效得分具体如下：

指标名称	指标权重	实际得分
<b>B1 资金到位</b>	<b>7.00</b>	<b>6.60</b>
B11 自筹资金的到位率（2）	2.00	1.60
B12 资金拨付的及时性（5）	5.00	5.00
<b>B2 资金管理</b>	<b>10.00</b>	<b>8.00</b>
B21 资金使用的合规性（5）	5.00	5.00
B22 资金支付依据的完整性（5）	5.00	3.00
<b>B3 财务管理</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
B31 财务管理制度的健全性、规范性（1）	1.00	1.00
B32 会计核算的规范性（1）	1.00	1.00
<b>B4 组织实施</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
B41 项目调整规范性（2分）	2.00	2.00
B42 投资变更率（1分）	1.00	1.00

指标名称	指标权重	实际得分
B43 制度执行有效性(3 分)	3.00	3.00
合计	<b>25.00</b>	<b>22.60</b>

## B1.资金到位

该部分主要考察项目实施单位是否按照规定时间要求及时拨付资金，考察项目实施单位（企业）承诺的自筹资金到位率。

### B11.自筹资金的到位率

自筹资金的到位率考察的是各项目村和项目实施单位（企业）承诺的自筹资金到位比率。项目按照“先建后补”、“民办公助”、村民“一事一议”方式实施，项目均已经建设完工。据此判断自筹资金已到位。但项目自筹资金因涉及较多村委会和多家企业，无法判断自筹资金到位具体金额情况。因此，按评分标准扣 0.4 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1.6 分。

### B12.资金拨付的及时性

该指标考察的是项目实施单位是否按照规定时间要求及时拨付资金。根据东西部资金下拨文件及实施方案，区农业农村局按照项目进度及合同条款及时支付项目工程款、设备购置款及包装设计等费用，项目资金拨付及时。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

## B2.资金管理

该部分主要考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是

否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用等情况。考察资金申请、拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否存在虚列支出、大额现金支付等情况，是否能够提供合法的票据，是否符合相关制度规定。

#### B21.资金使用的合规性

经现场查账，根据下拨资金的通知及实施方案，各项目村按照项目进度及合同约定及时支付项目工程款，项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

#### B22.资金支付依据的完整性

该指标考察的是资金申请、拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否存在虚列支出、大额现金支付等情况，是否能够提供合法的票据，是否符合相关制度规定。

根据项目辅助明细账，我们查看了本项目会计记账凭证及附件进行检查，该项目资金申请拨付时填写了《财政项目资金直接（授权）支付审批表》、《广元市昭化区援助项目资金拨付款申请表》及《昭化区项目报账申报表》，审批表主要内容包括项目名称、资金来源、资金性质、拨出、拨入单位信息、合同金额、本期拨款金额、累计拨款金额等主要信息，还包含了项目实施单位意见、区协作办审批意见、区项目分管县级领导审批意见、区分管财政县级领导审批意见等资金拨付过程中必须执行的审批程序。财务记账凭证附件除资金直接（授权）支付审批表和广元

市昭化区援助项目资金拨付款申请表、昭化区项目报账申报表外,还包含项目验收报告、现场照片等重要的依据及合法的发票。发票信息完整、规范,在评价过程中未发现存在虚列支出、无大额现金支付等情况。但所有建设报销凭证中均无项目施工合同,部分凭证审批手续不齐全,如温室大棚建设的施工合同未装入会计凭证中,4月份12号凭证项目管理单位负责人未签字等。根据评分标准得分值的60%。

该指标满分5分,根据评分标准得3分。

### **B3.财务管理**

该项主要考察项目的财务制度是否健全、管理是否规范,会计核算是否按照现行会计准则、会计制度和会计基础工作规范的要求。

#### **B31.财务管理制度的健全性、规范性**

该指标考察的是项目的财务制度是否健全、管理是否规范,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

区农业农村局根据相关的财政法规建立了健全的财务管理制度、内控制度、岗位责任制等约束单位的经济活动的管理制度,制度健全规范,在评价过程中未发现因财务管理制度的缺陷而导致项目专项资金损失,截留、挪用等严重的违法违规现象,保障了资金的安全性。

该指标满分1分,根据评分标准得1分。

### B32.会计核算的规范性

在项目评价过程中，我们通过现场查看区农业农村局的拨款文件、账务处理以及区农业农村局支付工程款及相关费用时的账务处理、会计凭证附件等情况，账务处理规范，会计核算科目使用准确，未发现入账不及时，重复列支的情况。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

### B4.组织实施

该项主要考察项目调整是否按规定向主管部门申报并得到批准，严格履行相关文件的申报程序，考察项目投资变更额占项目总投资投入的比重，考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行，项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行，考察与项目相关的合同是否有效执行，考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整规范。

#### B41.项目调整规范性

项目调整的规范性考察的项目实施单位是否按规定向主管部门申报并得到批准，严格履行相关文件的申报程序等情况。该项目严格按照东西部扶贫协作三年行动计划、项目实施方案及申请等文件进行项目实施，评价过程中，未发现存在项目调整的事项发生。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### B42.投资变更率

项目投资变更率考察的是项目投资变更额占项目总投资投入的

比重。该项目严控预算，在项目实施过程中未发生项目投资变更。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

#### B43.制度执行有效性

制度执行有效性考察的是项目实施单位制订的管理制度是否有效执行；项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行；考察与项目相关的合同是否有效执行；考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整规范。

项目实施按照相关管理制度和投资协议及补充协议约定内容执行，对年度资金拨付前提条件相关要求有效执行。通过调研、资料收集、横向合作、纵向审查等方式基本实现项目有效监管。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

### 3.目标完成

C 类目标完成类指标，包括项目规模、项目标准和项目时限 3 个二级指标，由 4 个三级指标构成，标准分值 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.67%。各分项指标的评价分析和绩效得分具体如下：

指标名称	指标权重	实际得分
<b>C1 项目规模</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
C11 实际完成率（8）	8.00	8.00
C12 成本节约率（2）	2.00	2.00
<b>C2 项目标准</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
C21 质量达标率（3）	3.00	3.00
<b>C3 项目时限</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
C31 完成及时性（2）	2.00	0.00
合计	<b>15.00</b>	<b>13.00</b>

## C1.项目规模

考察项目实际完成任务量，是否按计划按时完成。

### C11.实际完成率

经查阅实施方案、财政投资评审通知及项目支出明细账、验收报告等资料及现场勘察，该项目实际完成任务量与目标完成任务量相匹配，按预定目标完成了土鸡标准化育雏中心 13 个。新建育雏舍总面积 16200 平方米，每栋育雏舍配套了自动饮水、自动投料、自动温控等设备。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

### C12.成本节约率

经查阅项目实施方案及财政直接支付的单据和明细账，项目概算总金额为 814 万元。截止 2021 年 8 月 31 日财政部门付出的培训费、设备款、工程款等共计 380 万元，企业自筹资金 434 万元。项目未超预算完成。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

## C2.项目标准

考察项目的验收情况，是否符合目标设定的验收标准，是否达到了行业的基准水平。

### C21.质量达标率

质量达标率是考察项目的验收情况，是否符合目标设定的验收标准，是否达到了行业的基准水平的定量指标。经查阅验收报告及相关验收的会议纪要和现场勘察，在评价过程中未发现该项

目出现未达标的情况。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

### C3.项目时限

#### C31.完成及时性

该指标考察的是项目产出时效目标的实现程度，是否按照计划按时完工。

经查阅《广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”东西部扶贫协作剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）实施方案》、项目施工合同及相关的会议纪要等资料，项目计划实施时间为 2020 年 1 月至 2020 年 6 月，实际实施时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。超过计划时间 6 个月。根据（实际完成时间-目标设定完成时间）÷目标设定完成时间×100%=(12-6)÷6×100%=1。按评分标准， $x > 15\%$ ，不得分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 0 分。

### 4.项目效果

D 类项目效果类指标，包括经济效益、社会效益和功能实现 3 个二级指标，由 7 个三级指标构成，标准分值 40 分，实际得分 38.10 分，得分率 95.25%。各分项指标的评价分析和绩效得分具体如下：

指标名称	指标权重	实际得分
<b>D1 经济效益</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
D11 产量增加（5）	5.00	5.00
D12 项目经济贡献（5）	5.00	5.00
<b>D2 社会效益</b>	<b>20.00</b>	<b>18.10</b>

指标名称	指标权重	实际得分
D21 受益群体满意度（10）	10.00	8.10
D22 产业带动作用（5）	5.00	5.00
D23 可持续发展性（5）	5.00	5.00
<b>D3 功能实现</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
D31 运行情况（5）	5.00	5.00
D32 后续维护（5）	5.00	5.00
合计	<b>40.00</b>	<b>38.10</b>

## D1.经济效益

考察项目建成后，该项目产业增产情况，综合该项目总投资情况、产值情况等考察该项目对地区经济贡献。

### D11.产量增加

该项考察项目建成后，该项目产业增产情况。

根据实地调研、访谈及企业提供的项目投资和产值统计等相关资料，育雏中心建成后，每个育雏中心可提供脱温鸡苗 10 万羽，合计每年可供应脱温鸡苗 130 万羽，为全区土鸡养殖农户提供健康优质的脱温鸡苗，提高农户养殖成活率 5%以上。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

### D12.项目经济贡献

育雏中心建成后，为全区土鸡养殖农户提供健康优质的脱温鸡苗，提高农户养殖成活率 5%以上，帮助农户节约外地鸡苗运费、运输损耗等费用 1 元/只，有力的促进了全区剑门关土鸡产业发展。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

## D2.社会效益

考察受益群体满意度；目标项目对相关产业和农户的积极带动作用及项目可持续发展性。

### D21.受益群体满意度

该项考察受益群体满意度。通过线上线下填写调查问卷方式，对受益群众满意度进行考察。根据调查问卷统计结果，广元市昭化区农业农村局相关人员及受益群众对政策支持满意度为 81%（详见附件二：广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）绩效评价满意度问卷调查分析报告）

通过综合问卷分析，本次问卷调查受益群众满意度较好，根据受益群体满意度= $\sum nipi / \sum ni \times$ 分值。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；i-满意状态。问卷调查中得分比值设置，非常满意得满分，满意 0.8，一般满意 0.6 分，不太满意 0.3，不满意 0.1 分。

X\Y	很满意	基本满意	满意度一般	不满意	小计
机关企事业单位职工	6(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	6
个体户	5(83.33%)	1(16.67%)	0(0.00%)	0(0.00%)	6
企业员工	17(80.95%)	1(4.76%)	2(9.52%)	1(4.76%)	21
农民	32(86.49%)	5(13.51%)	0(0.00%)	0(0.00%)	37
学生	2(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
无固定职业	4(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	4

受益群体满意度= $(6 \times 1 \times 100\% \times 1 + 5 \times 1 \times 100\% \times 1 + 1 \times 0.8 \times 16.67\% \times 0.8 + 17 \times 1 \times 80.95\% \times 1 + 1 \times 0.8 \times 4.76\% \times 0.8 + 2 \times 0.6 \times 9.52\% \times 0.6 + 1 \times 0.1 \times 4.76\% \times 0.1 + 32 \times 1 \times 86.49\% \times 1 + 5 \times 0.8$

$\times 13.51\% \times 0.8 + 2 \times 1 \times 100\% \times 1 + 4 \times 1 \times 100\% \times 1) / (6 \times 1 + 5 \times 1 + 1 \times 0.8 + 17 \times 1 + 1 \times 0.8 + 2 \times 0.6 + 1 \times 0.1 + 32 \times 1 + 5 \times 0.8 + 2 \times 1 + 4 \times 1) \times 10 = 8.10$

该指标满分 10 分，根据评分标准得 8.10 分。

#### D22. 产业带动作用

经实地勘察，产业带动作用较好。

剑门关土鸡标准化育雏中心的建设，带动了农户积极性。对畜牧业、种植业等相关产业发展具有一定的带动作用。

该项指标标准分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

#### D23. 可持续发展性

①政策角度。国家和各地省市陆续出台很多“三农”政策，土鸡行业也得到高度重视，出台了许多针对土鸡产业的优惠政策。

②市场角度。随着政策、环保意识等多方位因素推动，利用“龙头企业+村集体+专合社+农户”利益机制联合，促进土鸡养殖发展。

③项目建设角度。上级政策扶持，结合土鸡养殖产业成本小、易操作、林地养鸡的特点，对广大贫困户进行指导和带动，使其逐步成为贫困户能够紧紧依靠的增收来源。近年，广元市昭化区把发展土鸡产业作为精准扶贫的重要平台，不断扩大养殖规模和范围，实行整乡整镇推进，取得了非常好的效果。

综上，该项目可持续发展性好。

该项指标标准分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

### **D3.功能实现**

考察项目达到预定可使用状态后的运行情况及项目投入使用后的维护制定及执行情况。

#### **D31.运行情况**

运行状况考察的是项目达到预定可运行、使用状态后的运行状况。经实地勘察，项目运行状况很好，设备无故障，鸡苗健康，按时出货。

该项指标标准分为 5 分，根据评分标准得 5 分

#### **D32.后续维护**

后续维护考察的是项目投入使用后的维护制定及执行情况。经询问，土鸡养殖由养殖户自主管理，自主经营，自负盈亏。经实地考察，从雏鸡喂养到出售，整个生产线运行流畅，有效提高了雏鸡存活率。

该项指标标准分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

## **四、项目存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1.项目立项规范性有待提高。**

通过了解和向本项目管理专员证实，此项目属于东西部扶贫协作三年行动计划延续性项目，未针对 2020 年项目编制项目可行性研究报告。在申报的各环节，尤其是每个子项目立项前期调研都需要专业人员进行指导及科学论证，领导小组的审定才具有

可行性。

## 2.预算编制准确性有待提高。

项目预算未对具体的成本进行明细测算，如建设育雏中心未对平地费、地面硬化、辅料费等成本进行细分并作充分比价。

## 3.部门内部控制有待提高。

①项目组织实施中，主管部门对项目业主自筹资金监控不到位，自筹资金没有规范的台账管理。

②部分施工合同签订不规范。如新场村养殖示范场设备安装合同中，乙方未盖章或按手印。

### （二）建议和改进措施

#### 1.规范项目申报程序，建立健全扶贫项目库管理制度，加强部门间有效沟通。

一是项目在申报时要进行可行性论证，经过摸底排查后才能上报。对于符合程序上报的项目，财政部门在资金下达到位后，要加强监管，避免财政扶贫资金安排后不能发挥应有的效应。二是建立健全扶贫项目库管理制度，开展项目复核，把好项目入库“质量关”。围绕建库原则，根据脱贫目标任务目标要求和项目实施情况，建立并逐步完善项目动态调整机制，强化项目库动态筛查、清理，进一步提高项目入库、实施的精准度。三是加强部门之间沟通协调，积极应对并解决问题。项目组织部门要加强沟通协调，一方面要加强与农户的思想沟通，另一方面要加强部门与部门之间的沟通，对接项目镇工作，及时摸清情况，采取有力

措施解决好项目计划和实际执行之间的矛盾。强化制度化意识，加强制度完善和执行的力度。

## **2.加强提高编制预算的科学性、准确性水平。**

一是加强领导，进一步规范部门预算编制。树立预算编制的全员参与意识，成立以部门主要领导为核心的预算草案编制审核小组，明确职责分工，将项目立项、预算编报及审核责任明确到个人。提高参与人员的整体素质，提高业务科室项目资金的测算分析水平。二是将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。建立绩效目标、绩效评价与预算安排挂钩机制，对填报绩效目标不符合要求的项目，不予安排预算；对绩效不高的项目，督促及时整改；对绩效水平高的项目，在资金安排上予以倾斜。建立单位内部预算绩效评价考核机制，更加注重结果导向、强化责任约束力度，明确具体的考核对象，提高预算管理水平和实施效果。

## **3.增强内部控制力度，提升项目管理水平。**

一是要建立健全系统、规范、严格全过程各环节的制度体系。内容涵盖资金项目储备立项、分配执行、组织实施、监督管理、绩效评价、信息公开等，推进资金与项目管理程序化、制度化、法治化，做到立项公开透明、资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责权能统一。二是要配足配强项目管理专（兼）职人员，加强对项目管理人员综合素质的培养。着力提高项目资金管理的水平和能力，并加大对项目实施主体的培训，着重提高实施主体在项目计划执行、财务规范管理、档案资料管理等方面

的素质水平。三是严格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，各项开支要有相关的费用标准等依据，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。四是加强对项目实施主体的日常指导监督，建立健全相应管理监督机制，对项目实施过程的细节把控，建立专业的技术推广和服务机构，定期检测雏鸡身体状况，做好防疫工作。

## 五、附件

附件一：广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）绩效评价指标体系暨评分表

附件二：广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）绩效评价满意度问卷调查分析报告

## 附件一：广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）支出

## 绩效评价绩效评价指标体系暨评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价得分
A 项目决策 (20 分)	A1 绩效目标 (6 分)	A11 绩效目标合理性 (3 分)	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	细化分解程度高, 得满分; 细化分解程度一般, 得分值的 60%; 细化分解程度低, 不得分。	3.00
		A12 绩效指标明确性 (3 分)	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	基本明确得分值的 60%; 有分布实施步骤和分步完成时间的为明确, 得满分	3.00
	A2 决策依据 (7 分)	A21. 立项依据充分性 (3 分)	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。	符合得满分, 不符合不得分	3.00
		A22. 立项程序的规范性 (4 分)	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	前期调研情况 (2 分); 立项程序规范性 (2 分)	2.00
	A3 资金投入 (7 分)	A31 资金分配过程的合规性、合理性、及时性 (3 分)	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用于反映和考核项目预算资金分配的合法性、合理性情况	合理得满分; 不合理不得分	3.00
		A32 预算编制科学性 (4 分)	4.00	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	一项 1 分; 存在一项不合理、不规范; 扣 1 分;	2.00
B 项目管理	B1 资金到位 (7 分)	B11 自筹资金的到位率 (2 分)	2.00	考核项目实施单位(企业) 承诺的自筹资金到位比。	自筹资金到位率 $x < 80\%$ , 不得分; $80\% \leq x < 85\%$ 得分值的 30%; $85\% \leq x < 90\%$ 得分值的	1.60

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价得分
(25分)	分)				60%; 90%≤x<95%得分值的 80%; 95%≤x 得满分; 根据项目实际, 此项指标无法适用, 则其分值平分调至资金拨付及时性指标。	
		B12 资金拨付的及时性 (5)	5.00	考察项目实施单位是否按照规定时间要求及时拨付资金	资金拨付及时得满分; 较及时得分值的 80%; 较滞后得分值的 60%; 滞后的得分值的 30%; 严重滞后不得分	5.00
	B2 资金管理 (10分)	B21 资金使用的合规性 (5)	5.00	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途, 是否专款专用, 是否存在截留、挤占、挪用等情况	出现任何一种情况判定为不合规, 不得分; 合规, 得满分	5.00
		B22 资金支付依据的完整性 (5)	5.00	考察资金申请、拨付是否具有完整的审批程序和手续, 是否存在虚列支出、大额现金支付等情况, 是否能够提供合法的票据, 是否符合相关制度规定。	符合规定, 得满分; 较合规, 得分值的 60%; 存在手续不完整、不合规, 不得分。	3.00
	B3 财务管理 (2分)	B31 财务管理制度健全性、规范性 (1)	1.00	考察项目的财务制度是否健全、管理是否规范, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	a. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; b. 项目财务管理制度 (包括资金管理制度、岗位分设制度) 是否合法、合规、完整; c. 是否存在需要完善的风险控制环节。全部符合, 得满分; 一项不符合, 得分值的 60%; 不规范, 不得分。	1.00
		B32 会计核算的规范性 (1)	1.00	会计核算是否按照现行会计准则、会计制度和会计基础工作规范的要求	全部规范得满分; 较规范, 得分值的 60%; 不规范, 不得分	1.00
	B4 组织实施 (6分)	B41 项目调整 (2分)	2.00	项目调整是否按规定向主管部门申报并得到批准, 严格履行相关文件的申报程序	履行相关手续得满分; 未履行, 不得分	2.00
		B42 投资变更 (1分)	1.00	考察项目投资变更额占项目总投资的比重	项目投资变更率 $x > 20\%$ , 不得分; $20\% \geq x > 15\%$ 的分值的 30%; $15\% \geq x > 10\%$ 的分值的 60%; $10\% \geq x > 5\%$ 得分值的 80%; $x \leq 5\%$ 得满分;	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价得分
		B43 制度执行 (3 分)	3.00	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行；项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行；考察与项目相关的合同是否有效执行；考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整规范	严格执行规定，得满分；较严格执行，得分值的 60%；未执行不得分	3.00
C 目标完成 (15 分)	C1 项目规模 (10 分)	C11. 实际完成率	8.00	考察项目实际完成任务量与目标设定任务量的比率。实际完成任务量/目标完成任务量*100%。实际完成任务量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；目标完成任务量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	比率 $x < 85\%$ ，不得分； $85\% \leq x < 90\%$ 得分值的 30%； $90\% \leq x < 95\%$ 得分值的 60%； $95\% \leq x < 100\%$ 得分值的 80%；100% 得满分；	8.00
		C12 成本节约率	2.00	成本节约率 = $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目未超预算完成 100% 得 2 分，超过预算不得分。	2.00
	C2 项目标准 (3 分)	C21. 质量达标率	3.00	考察项目的验收情况，是否符合目标设定的验收标准，是否达到了行业的基准水平；质量达标率 = $(质量达标产出数 / 实际产出数) \times 100\%$ 。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	不符合，得 0 分；符合得满分。根据项目实际，此项指标无法适用，则其分值平分调至项目规模和项目时限指标。	3.00
	C3 项目时限 (2 分)	C31. 完成及时性	2.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。（实际完成时间 - 目标设定完成时间） / 目标设定完成时间	比率 $x > 15\%$ ，不得分； $15\% \geq x > 10\%$ 得分值的 30%； $10\% \geq x > 5\%$ 得分值的 60%； $5\% \geq x > 0$ 得分值的 80%； $x \leq 0$ 得满分	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价得分
				*100%。		
D 项目效果 (40 分)	D1 经济效益 (10 分)	D11 产量增加 (5 分)	5.00	考察项目建成后，该项目产业增产情况（与当地或是同行业进行比较）。	每单位（项目区）增加产量 $x < \text{当地平均水平} \times 90\%$ 得 0 分； $\text{当地平均水平} \times 90\% \leq x < \text{当地平均水平} \times 100\%$ 得分值的 30%； $\text{行业平均水平} \leq x < \text{行业平均水平} \times 110\%$ 得分值的 60%； $\text{当地平均水平} \times 110\% \leq x < \text{当地平均水平} \times 120\%$ 得分值的 80%； $x \geq \text{当地平均水平} \times 120\%$ 得满分	5.00
		D12 项目经济贡献 (5 分)	5.00	综合该项目总投资情况、产值情况等，考察该项目对地区经济贡献	项目经济贡献高，得满分；项目经济贡献一般，得分值 60%；项目经济贡献低，不得分。	5.00
	D2 社会效益 (20 分)	D21 受益群体满意度 (10 分)	10.00	考察受益群体满意度。	受益群体满意度 = $\sum n_i p_i / \sum n_i \times \text{分值}$ 。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；i-满意状态	8.10
		D22 产业带动作用 (5 分)	5.00	考察目标项目对相关产业和农户的积极带动作用。	带动作用明显，得满分；带动作用一般，得分值 60%；带动作用不明显，不得分。	5.00
		D23 可持续发展性 (5 分)	5.00	综合项目后续管理、政策、市场等角度，考察该项目可持续发展性	项目可持续发展性强，得满分；项目可持续发展性一般，得分值 60%；项目可持续发展性弱，不得分。	5.00
	D3 功能实现 (10 分)	D31 运行状况 (5 分)	5.00	考察项目达到预定可运行、使用状态后的运行状况	运行好得满分；运行较好，得分值 80%；运行一般，得分值 60%；运行较差和运行差，不得分。	5.00
		D32 后续维护 (5 分)	5.00	考察项目投入使用后的维护制定及执行情况	有制度执行差或较差得分值的 30%；有制度执行一般得分值的 60%；有制度执行好或教好得满分；无后续维护不得分	5.00
	合计			100.00		

## 广元市昭化区 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖 基地建设项目（三期）绩效评价满意度问卷调查分析报告

根据《中华人民共和国预算法》、《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》（昭府办函〔2018〕118号）和《广元市昭化区财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作通知》要求，广元市昭化区财政局委托第三方机构北京博思恒效咨询有限公司对“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）东西部扶贫协作资金开展绩效评价，评价工作组对项目相关人员开展满意度问卷调查，现将调查情况报告如下：

### 一、调查问卷目的

为做好 2020 年“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）专项扶持资金项目支出绩效评价工作，了解“龙泉·昭化”剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目（三期）专项扶持资金项目 2020 年度的实施效果及相关方对该专项的满意度，同时征求区农业农村局的意见建议，为项目绩效评价的效益效果提供参考，支撑绩效评价工作开展问卷调查工作。

### 二、问卷设置及调查方法

#### （一）问卷设置

一、基础信息：

1、您的性别：

男       女

2、您的职业：

机关企事业单位职工       个体户       企业员工       农民       学生

无固定职业

二、调查内容

3、您知道广元市昭化区剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目吗？（单选）

知道                               不知道

4、在项目施工前期，您是否看到有关部门针对项目建设内容、工期、规模等情况进行公告？（单选）

有                       没有                       不知道

5、您觉得广元市农业农村局对“剑门关土鸡标准化养殖基地建设”项目的推动工作力度如何？（单选）

力度很大     力度较大       力度一般       力度较小       力度很小

6、您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，对您的生活质量实际有否提高？（单选）

有很大提高     有较大提高       稍有提高               无效果               有降低

7、您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，是否随时能购买到健康优质鸡苗？（单选）

随时能买到     偶尔能买到       基本买不到

8、您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，土鸡养殖存活率是否提高？（单选）

有很大提高     有较大提高       稍有提高               无效果               有降低

9、您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施过程中，您对单位的组织协调工作是否满意？（单选）

很满意       基本满意       满意度一般               不满意      原因为\_\_\_\_\_

10、您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，您觉得此项目的财政投入资金和群众自筹资金比例是否满意？（单选）

很满意    基本满意    满意度一般    不满意    原因为\_\_\_\_\_

11、“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施过程中，是否对项目经费的使用情况进行公示？（单选）

有    没有    不清楚

12、政府是否开展过“土鸡养殖”技术培训？培训过几次？（单选）

5次以下    5-10次    10次以上    没有开展过培训

13、您对广元市昭化区剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目是否满意？（单选）

很满意    基本满意    满意度一般    不满意    原因为\_\_\_\_\_

14、您认为剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目推进过程中存在哪些问题，并提供相关意见建议（包括对单位内部、政府补助资金使用、市场方面均可提出）？


## （二）调查方法

本次调查问卷主要采取线上发放和线下现场收集调查问卷的方法，本次调查问卷共计收回问卷 126 份，达到了预期的目标。根据现场问卷调查情况，经评价工作组讨论最终确定有效问卷为 76 份。

## 三、调查结果统计分析

### （一）基本信息

第 1 题 您的性别？ [单选题]

选项	小计	比例
男	44	 57.89%
女	32	 42.11%
本题有效填写人次	76	

第 2 题 您的职业？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

选项	小计	比例
机关企事业单位职工	6	7.89%
个体户	6	7.89%
企业员工	21	27.63%
农民	37	48.68%
学生	2	2.63%
无固定职业	4	5.26%
本题有效填写人次	76	

## （二）调查内容

第 3 题 您知道广元市昭化区剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目吗？[单选题]

选项	小计	比例
知道	74	97.37%
不知道	2	2.63%
本题有效填写人次	76	

第 4 题 在项目施工前期，您是否看到有关部门针对项目建设内容、工期、规模等情况进行公告？[单选题]

选项	小计	比例
有	70	92.11%
没有	2	2.63%
不知道	4	5.26%
本题有效填写人次	76	

第 5 题 您觉得广元市农业农村局对“剑门关土鸡标准化养殖基地建设”项目的推动工作力度如何？[单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

选项	小计	比例
力度很大	61	80.26%
力度较大	11	14.47%
力度一般	4	5.26%
力度较小	0	0%
力度很小	0	0%
本题有效填写人次	76	

第 6 题 您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，对您的生活质量实际有否提高？ [单选题]

选项	小计	比例
有很大提高	56	73.68%
有较大提高	16	21.05%
稍有提高	4	5.26%
无效果	0	0%
有降低	0	0%
本题有效填写人次	76	

综合问卷结果，受访群体认为“土鸡标准化养殖基地”项目建设后，94.73%的受访群众认为生活质量得到改善，5.26%认为稍有提高，满意度高。

第 7 题 您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，是否随时能购买到健康优质鸡苗？ [单选题]

选项	小计	比例
随时能买到	73	96.05%
偶尔能买到	3	3.95%
基本买不到	0	0%

本题有效填写人次 76

综合问卷结果，受访群体认为“土鸡标准化养殖基地”项目建设后，96.05%的受访群众认为随时能购买到健康优质的鸡苗，仅 3.95%认为偶尔才能买到，满意度高。

第 8 题 您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，土鸡养殖存活率是否提高？[单选题]

选项	小计	比例
有很大提高	65	85.53%
有较大提高	9	11.84%
稍有提高	2	2.63%
无效果	0	0%
有降低	0	0%
本题有效填写人次	76	

综合问卷结果，受访群体认为“土鸡标准化养殖基地”项目建设后，97.37%的受访群众认为鸡苗存活率有很大提高，2.63%认为稍有提高，满意度高。

第 9 题 您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施过程中，您对单位的组织协调工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
很满意	71	93.42%
基本满意	5	6.58%
满意度一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	76	

第 10 题 您觉得“剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施后，您觉得此项目的财政投入资金和群众自筹资金比例是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
很满意	63	82.89%
基本满意	11	14.47%
满意度一般	2	2.63%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	76	

第 11 题 “剑门关土鸡标准化养殖基地”项目实施过程中，是否对项目经费的使用情况进行公示？[单选题]

选项	小计	比例
有	67	88.16%
没有	0	0%
不清楚	9	11.84%
本题有效填写人次	76	

第 12 题 政府是否开展过“土鸡养殖”技术培训？培训过几次？[单选题]

选项	小计	比例
5 次以下	11	14.47%
5-10 次	30	39.47%
10 次以上	35	46.05%
没有开展过培训	0	0%
本题有效填写人次	76	

第 13 题 您对广元市昭化区剑门关土鸡标准化养殖基地

## 建设项目是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
很满意	66	 86.84%
基本满意	7	 9.21%
满意度一般	2	 2.63%
不满意	1	 1.32%
本题有效填写人次	76	

综合问卷结果，96%以上受访群体对“剑门关土鸡”项目满意，仅 1.32%不满意“剑门关土鸡”项目，满意度高。

第 14 题 您认为剑门关土鸡标准化养殖基地建设项目推进过程中存在哪些问题，并请提供相关意见建议（包括对单位内部、政府补助资金使用、市场方面均可提出）？ [填空题]

通过对收集问卷进行归集整理，企业遇到的问题和建议主要为以下几方面：

### （1）遇到的困难和问题

部分工程进度慢，影响产量


### （2）意见和建议

一是建立剑门关土鸡风险基金，加强市场对接，降低养殖风险；二是加强技术培训，加强项目推广；三是积极引进先进技术及人才引进，加强管理。

通过综合问卷分析，本次问卷调查基本达到预期效果，本项目信息公示及时，在项目推进过程中，未出现过任何安

全事故。项目组织管理、监督到位，受益群众满意度较好。根据受益群体满意度 =  $\sum n_i p_i / \sum n_i \times$  分值。其中： $n$ -受访者数量； $p$ -满意度权重； $i$ -满意状态。问卷调查中得分比值设置，非常满意得满分，满意 0.8，一般满意 0.6 分，不太满意 0.3，不满意 0.1 分。

X\Y	很满意	基本满意	满意度一般	不满意	小计
机关企事业单位职工	6(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	6
个体户	5(83.33%)	1(16.67%)	0(0.00%)	0(0.00%)	6
企业员工	17(80.95%)	1(4.76%)	2(9.52%)	1(4.76%)	21
农民	32(86.49%)	5(13.51%)	0(0.00%)	0(0.00%)	37
学生	2(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
无固定职业	4(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	4

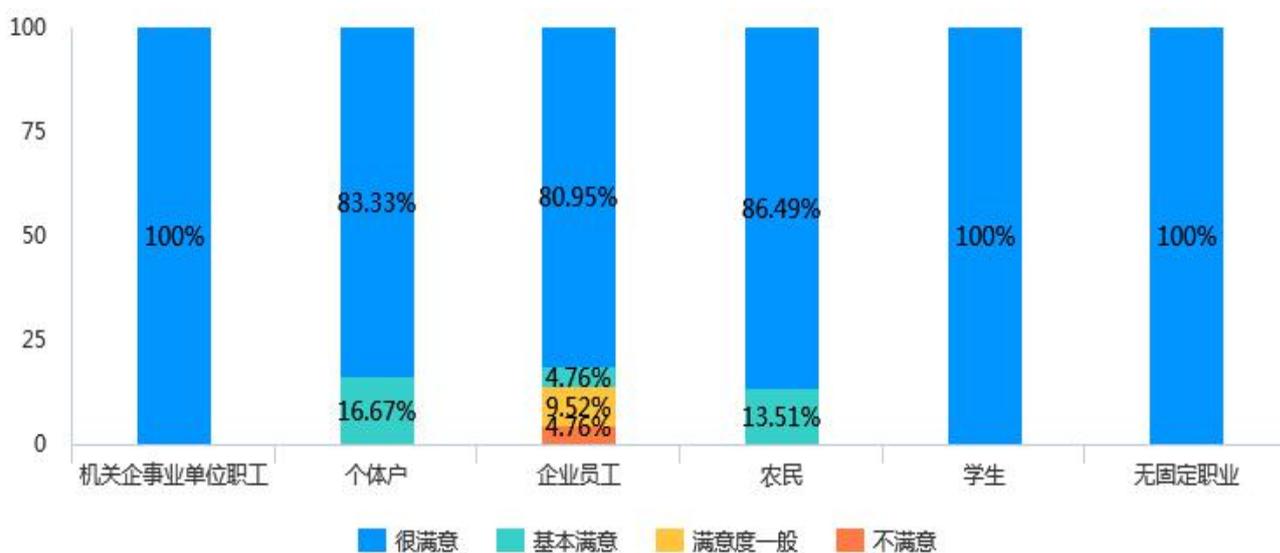

受益群体满意度 =  $(6 \times 1 \times 100\% \times 1 + 5 \times 1 \times 100\% \times 1 + 17 \times 1 \times 80.95\% \times 1 + 1 \times 0.8 \times 4.76\% \times 0.8 + 2 \times 0.6 \times 9.52\% \times 0.6 + 1 \times 0.1 \times 4.76\% \times 0.1 + 32 \times 1 \times$

$$86.49\% \times 1 + 5 \times 0.8 \times 13.51\% \times 0.8 + 2 \times 1 \times 100\% \times 1 + 4 \times 1 \times 100\% \times 1) / (6 \times 1 + 5 \times 1 + 1 \times 0.8 + 17 \times 1 + 1 \times 0.8 + 2 \times 0.6 + 1 \times 0.1 + 32 \times 1 + 5 \times 0.8 + 2 \times 1 + 4 \times 1) \times 10 = 8.10$$
